

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in ORIA -
di cui alla Legge 30/12/1960, n. 1676 - Esercizio 1-7 / 31-12-1964

Impresa CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUC.
E LAVORO - RAVENNA -

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18 MAGGIO 1966

CONTRATTO in data 24/9/1965, n. 4642 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 28/9/1965
al n. 1849 Mod. 71n.

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.

78.850.000=

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 2,10 per cento

77.194.150=

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

6.150.000=

Per espropriazione L.

» mag. lavori impreved. »

594.000=

» lavori ad economia »

825.000=

» sorveglianza e dir. »

4.731.000=

TOTALE somma impegnata L.

6.150.000=

Data della consegna

25/9/1965

Data dell'incominciamento
dei lavori

25/9/1965

Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz dei lavori

19/9/1966

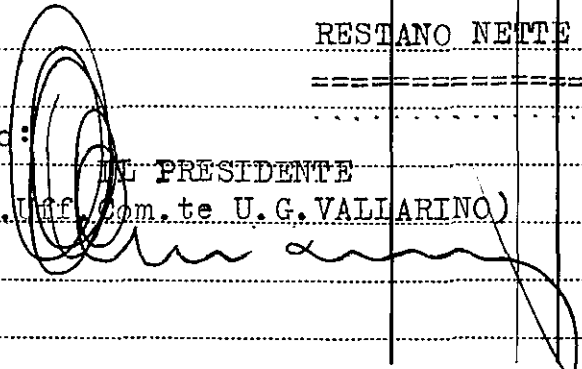
I lavori rimasero sospesi o
prorogati per.

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è

Giorni impiegati in più

meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo ristretto di terra mc.	1504,11	1.200=	1.804.932,00	
2	33	Calcestruzzo a Kg.150 "	100,05	7.000=	700.350,00	
3	31	Calcestruzzo a Kg.200 "	411,04	12.500=	5.138.000,00	
4	36b	Calcestruzzo a Kg.300 "	3,59	14.500=	52.055,00	
5	62	Ferro omogeneo Kg.	15061,23	150=	2.259.184,50	
6	15	Muratura tufo cm.43 mc.	133,79	6.000=	802.740,00	
7	17	Muratura tufo cm.20 mq.	105,29	1.500=	157.935,00	
8	13	Muratura tufo e carparo mc.	9,77	8.000=	78.160,00	
9	32	Calcestruzzo a Kg.200 "	17,23	8.500=	146.455,00	
		Sommano lavori a misura			£.11.139.811,50	
		B) - LAVORI A FORFAIT				
10	11	C.S.A. - Rustico: mc.7.090,50x48%=mc.	3.403,44	6.270=	21.339.568,80	
11	11	C.S.A. - Tramezzi: mc.1.700,00x8% = "	136,00	6.270=	852.720,00	
12	11	C.S.A. - Impianto idrico-sanitario-elettrico: mc.3.294,20x9% "	296,478	6.270=	1.858.917,06	
13	11	C.S.A. - Infissi: mc.2.453,67x12% "	294,44	6.270=	1.846.141,31	
14	11	C.S.A. - Pavimenti: mc.1.402,10x10% "	140,21	6.270=	879.116,70	
		Sommano lavori a forfait			£.26.776.463,87	
		TOTALE LAVORI A MISURA E A FORFAIT			£.37.916.275,37	
		A dedurre il ribasso d'asta del 2,10% ... "			796.241,78	
		RESTANO NETTE LIRE			£.37.120.033,59	
		Visto:  IL PRESIDENTE Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)			IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)	

