



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

140

del 27-01-2015


ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	33240	Art.	0	Codice di bilancio	209040100	Gestione	RESIDUI/1988
PROLUNGAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA IDRICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE LL.PP./MANUT.	nr. 893	del. 13-11-2014
numero 486		del 14-11-2014		Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Realizzazione nuovi loculi cimiteriali - Approvazione e liquidazione 3' stato di avanzamento lavori.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA	18.576,03	34.117,86	
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		PRESENTE IMPORTO	18.576,03	18.576,03	
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO	18.576,03	18.576,03	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	15.541,83	
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 2) MUTUI CASSA DD.PP.				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 18.576,03 dicensi DICOTTOMILACINQUECENTOSETTANTASEI/03							
Per : Realizzazione nuovi loculi cimiteriali - Approvazione e liquidazione 3' stato di avanzamento lavori.							

CREDITORE (Codice: 5441)				
DE.MA.COSTRUZIONI S.R.L. P.Iva 01901340719		VIA MADDALONI,43 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:54408191E0 ACCONTO Fatt.n. 13 del 14/11/2014 LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI 3^ SAL		18.576,03	2103
			18.576,03	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI (IT 03 A 01010 78382 100000002137) - CIN: A - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000002137 IBAN: IT03A0101078382100000002137			


UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 60.637,60
VEDI MANDATI N. 140 A 141



PAGATO
29 GEN 2015
Banco di Napoli S.p.A.
BACI CREDITO 5770

Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 160 CAP. 33240 BIL. 2008

~~IMPEGNO~~ N. CIR. 486

IMPORTO € 18.576,04

RITENUTA € _____

REV. N. _____

CREDITORE: cod. N. (5441) DE. RA

PAGAMENTO FATTURA

CIR. SALDO 3^a SAL. LOCULI CIMITENACI

CIG:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 893 del 13/11/04



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.893/149

In data 13-11-14

OGGETTO: Realizzazione nuovi loculi cimiteriali - Approvazione e liquidazione 3' stato di avanzamento lavori.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **tredici** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-11-14

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

OO.PP.-MANUTENZIONE

IZZILLO ING. CLORINDO, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con deliberazione G.C. n. 291 del 24/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo di complessivi € 255.000,00 da porre a base d'appalto, redatto dal Dirigente dei lavori Pubblici ing. Clorindo Izzillo, per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali, al fine di supportare le attuali urgenti esigenze.

L'intervento è stato inserito nel piano triennale dei LL.PP. 2013-2015, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 26/03/2013.

Con determinazione dirigenziale n. 954/151 del 05/12/2013 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata di cui all'art.57, comma 6 del D.lgs 163/2006 con il sistema di aggiudicazione di cui all'art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, cioè con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione del 10% arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Saranno escluse automaticamente dalla gara le offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali, giusta art. 122, comma 9 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i., purché in presenza di non meno di n. 10 (dieci) offerte valide.

L'invito di gara è stato diramato in data 12/12/2013 con nota prot. n. 28387 e successiva proroga del 2/01/2014 a n. 19 ditte locali.

Alla gara, tenutasi in data 15/01/2014, hanno partecipato n. 14 Ditte.

Con determinazione dirigenziale n.226/25 del 13/03/2014 è stato preso atto della regolarità della procedura seguita nell'esperimento di gara per l'appalto dei lavori di "realizzazione di nuovi loculi cimiteriali" CUP J34H13000070004 - CIG 54408191E0, con contestuale approvazione del relativo verbale di gara del 15/01/2014 e definitiva aggiudicazione dei lavori alla ditta DE.MA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Cerignola alla via Maddaloni n. 43, per il prezzo di € 163.829,72, dedotto del ribasso del 5.315% sull'importo a base d'asta di € 211.263,01 (di cui € 8.068,60 per oneri della sicurezza ed € 30.168,36 per incidenza della manodopera).

Con determinazione dirigenziale n.244/27 del 26.03.2014 sono state incaricate della direzione dei lavori l'arch. Cristina Caterino e l'ing. Vincenza Mansi, costituitesi in ATP, per la direzione, contabilizzazione e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dell'intervento - CIG ZA50E786AB.

Con la suddetta determinazione dirigenziale n.244/27/2014, a seguito dell'appalto dei lavori ed affidamento degli incarichi di

direzione lavori e coordinamento sicurezza, è stato altresì provveduto alla rideterminazione del quadro economico, che ha confermato la spesa progettuale in complessivi € 255.000,00, secondo il seguente quadro economico:

A1) LAVORI A CORPO:			
TOTALE LAVORI			€ 202.066,67
di cui oneri della sicurezza			€ 8.068,60
Di cui Incidenza della manodopera			€ 30.168,36
iva sui lavori (10%)			€ 20.206,67
TOTALE LAVORI			€ 222.273,35
A 2) SPESE TECNICHE			
A 2.1) Progettazione esecutiva,			
Progettazione e coord. sicurezza(ex art. 92 del D.Lgs. 163/06)			€ 3.168,95
A 2.2) Dir. Lavori, Misura e Contabilità			€ 11.500,00
Coordinamento della Sicurezza			
in fase di Esecuzione			€ 9.500,00
Totale			€ 21.000,00
CNPAIA (4%)			€ 840,00
iva su spese tecniche (22%)			€ 4.620,00
TOTALE SPESE TECNICHE			€ 29.628,95
Imprevisti ed arrotondamenti			€ 3.097,70
TOTALE LAVORI A1)+ A2)			€ 255.000,00

La spesa progettuale di € 255.000,00 è stata finanziata come segue:

€ 135.319,56 al cap. 34753 - imp. n. 407/1 con accertamento in entrata al cap. 50745, acc. n. 581/1 correlato al mutuo Cassa DD.PP. posiz. n. 4403976.01;

€ 18.576,04 al cap. 33240 imp. 2009/4 con accertamento in entrata al cap. 50240, acc. n. 390/1, correlato al mutuo Cassa DD.PP. posizione n.4115312.00;

€ 97.352,59 al cap. 30585 del bil. 2013 - impegno n. 760;

€ 3.751,81 al cap. 36061 - impegno n. 1085/sub 1.

Tra la citata appaltatrice "DE.MA. Costruzioni Srl" e l'Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 29/04/2014 con repertorio n. 153, registrato a Cerignola in data 05/05/2014 al n.22 S.1^ aa.pp.

I lavori sono stati consegnati in data 08/05/2014, giusto verbale in atti, e regolarmente e concretamente iniziati in pari data.

Nel corso delle operazioni di scavo è stata rilevata una stratigrafia del terreno diversa da quella prevista in progetto,

la quale pur non comportando una modifica architettonica né strutturale ha determinato la indifferibile esigenza di eseguire diverse e maggiori lavorazioni rispetto a quelle contrattuali, nonché la necessità dello spostamento del sedime del fabbricato per ottenere una distanza maggiore dalle tombe esistenti, onde evitare l'insorgere di frane durante i lavori di scavo.

La sorpresa geologica e lo spostamento del sedime del fabbricato hanno imposto, per sopraggiunte oggettive esigenze, l'adozione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.161, comm. 8 e 12 del DPR 207 e art.132 del D.lgs. 163/06, approvata con determinazione dirigenziale n.629/95 del 09/09/2014.

Per effetto della suddetta perizia di variante e suppletiva l'importo per lavori è stato rideterminato in € 182.714,68 al netto del ribasso d'asta del 5,315%, mentre gli oneri della sicurezza e la incidenza della manodopera, non soggetti a ribasso, sono stati confermati rispettivamente in € 8.068,60 ed € 30.168,36 stabilendo l'importo contrattuale in € 220.951,64, con l'incremento di € 18.884,96 rispetto all'originario di € 202.066,68, pari al 9,346% dell'originario importo contrattuale e, quindi, contenuto nei limiti previsti dalla vigente normativa (art.161, comma 12, del DPR 207 e art.132 del D.lgs. 163/06).

La spesa progettuale per effetto delle maggiori e diverse opere è stata rideterminata in complessivi € 271.043,86, secondo il seguente quadro economico, con un maggior importo di € 16.043,86 rispetto all'originaria previsione:

A.1LAVORI A CORPO:	post gara / affidamenti	Perizia Variante / suppletiva
TOTALE LAVORI di cui per	€ 202.066,68	€ 220.951,64
oneri della sicurezza	€ 8.068,60	€ 8.068,60
Incidenza della manodopera	€ 30.168,36	€ 30.168,36
iva sui lavori (10%)	€ 20.206,67	€ 22.095,17
TOTALE LAVORI	€ 222.273,35	€ 243.046,81
A.2 SPESE TECNICHE		
A.2.1 Progettazione esecutiva: Progettazione e coord. sicurezza(ex art. 92 del D.Lgs. 163/06)	€ 3.168,95	€ 3.168,95
A.2.2 Dir. Lavori, Misura e Contabilità	€ 11.500,00	€ 11.500,00
A.2.3 Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€ 9.500,00	€ 9.500,00
Totale	€ 21.000,00	€ 21.000,00
CNPAIA (4%)	€ 840,00	€ 840,00
iva su spese tecniche 22% /p(su € 10.500,00+€ 420,00)	€ 4.620,00	€ 2.402,40
TOTALE SPESE TECNICHE	€ 29.628,95	€ 27.411,35
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.097,70	€ 585,70
TOTALE LAVORI A1)+ A2)	€ 255.000,00	€ 271.043,86

Al finanziamento della stessa è stato provveduto come segue:

€ 135.319,56 al cap. 34753 - impegno n. 407/1 con accertamento in entrata al cap. 50745, acc. n. 581/1 correlato al mutuo Cassa DD.PP. posiz. n. 4403976.01;

€ 18.576,04 al cap. 33240 - impegno n. 2009/4 con accertamento in entrata al cap. 50240, acc. n. 390/1, correlato al mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4115312.00;
 € 97.352,59 al cap. 30585 del bilancio 2013 - impegno n. 760;
 € 3.751,81 al cap. 36061 - impegno n. 1085/sub 1;
 € 16.043,86 all'intervento 2.01.05.01, cap. 30047, RR.PP. 2004, impegno n. 3356/Sub provv. n. 1.

I lavori sono stati sospesi il 7.8.2014 e ripresi il 25.08.2014.

Il termine per la esecuzione dei lavori, fissato dal C.S.A. in gg. 180 dalla consegna degli stessi, non viene in alcun modo modificato, cosicché la ultimazione degli stessi rimane confermata per il 3.11.2014.

Tra la citata appaltatrice "DE.MA. Costruzioni Srl" e l'Amministrazione è stato stipulato il relativo atto di sottomissione, per scrittura privata in data 24/09/2014 raccolta n. 395/Uff.contratti.

La Direzione Lavori ha trasmesso, giusta nota acquisita in data 03/11/2014 col n.24521, il 3° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti dall'appaltatrice dei lavori, De.Ma Costruzioni Srl, a tutto il 03/11/2014, per il complessivo importo netto di € 220.951,64, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 8.068,60 e della incidenza della mano d'opera pari ad € 30.168,33 non soggetti a ribasso, nonché il relativo certificato di pagamento n.3, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotti le ritenute di legge e gli acconti di cui ai precedenti SAL, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta appaltatrice il credito di € 72.905,29, oltre IVA.

Considerata la regolarità degli atti, si ritiene di poter procedere all'approvazione del suddetto 3° stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento con conseguente liquidazione a favore della cita ditta DE.MA. Costruzioni Srl del corrispettivo lavori 3° SAL di € 80.195,82, IVA compresa.

La spesa di complessivi € 80.195,82, necessaria per il pagamento del credito come sopra riconosciuto a favore della Ditta DE.MA. Costruzioni Srl, trova imputazione:

€ 42.061,57 al cap. 34753 - imp. n. 407/1 - liquid. provv. n. 340, con accertamento in entrata al cap. 50745, acc. n. 581/1, correlato al mutuo assunto con Cassa DD.PP. posizione n. 4403976.01;
 € 18.576,04 al cap. 33240 imp. 2009/4 liquidaz.provv.345 con accertamento in entrata al cap. 50240, acc. n. 390/1, correlato al mutuo Cassa DD.PP. posizione n.4115312.00 alla quale verranno inoltrate adeguate istanze di somministrazione;
 € 16.043,86 all'intervento 2.01.05.01, cap. 30047, RR.PP. 2004, impegno 3356/Sub 2, liquid. provv. n. 346;
 € 3.514,35 al cap. 30585, imp.760/sub 2, liquid. Provv. n. 347, procedendo a ridurre l'impegno di cui al sub 3 assun-

to con D.D. n.244/27 del 26/03/2014 da € 28.749,84 a € 24.242,40 a seguito della non applicabilità dell'IVA sulla quota DL dell'ing.V.Mansi, giusta D.D. n. 666/104 del 9.9.2014 di rimodulazione del quadro economico a seguito della perizia di variante/suppletiva, e ad aumentare contestualmente per pari importo l'impegno di cui al sub 2 destinato all'impresa DE.MA Costruzioni srl che da € 68.377,75 passa a € 72.885,19 per effetto della variante.

Per effetto della variante di cui alla richiamata D.D. n.666/104 del 9.9.2014 e la stessa motivazione inerente non applicabilità dell'IVA sulla quota DL dell'ing.Mansi, dovrà altresì procedersi allo svincolo dell'impegno 1085 sub 1 liq. 108 assunto al cap.36061 per € 879,11.

Al presente intervento è stato attribuito il CUP J34H13000070004, alla gara di cui alla presente liquidazione il CIG 54408191E0.»

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti DPR 207/2010;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare il 3° stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di nuovi loculi cimiteriali, emesso dalla Direzione lavori per il complessivo importo netto di € 220.951,64, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 8.068,60 e della incidenza della mano d'opera pari ad € 30.168,33 non soggetti a ribasso, ed eseguiti a tutto il 03/11/2014 dall'impresa DE.MA. Costruzioni Srl, in dipendenza del citato contratto di appalto repertorio n.153 del 29/04/2014,

registrato a Cerignola in data 05/05/2014 al n.22 S.1^ aa.pp. e successivo atto di sottomissione, per scrittura privata in data 24/09/2014, raccolta n. 395/Uff.Contr.;

3) di approvare il relativo certificato di pagamento n. 3, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale dedotti le ritenute di legge e gli acconti di cui ai precedenti SAL è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta appaltatrice il credito di € 72.905,29, oltre IVA nella misura del 10%;

4) di liquidare e pagare, previo accredito delle necessarie somme da parte della Cassa DD.PP., a favore all'impresa DE.MA. Costruzioni Srl l'importo di complessivi € 80.195,82, IVA compresa, dandosi atto che la relativa spesa trova imputazione:

€ 42.061,57 al cap. 34753 - imp. n. 407/1 - liquid. provv. n.340, con accertamento in entrata al cap. 50745, acc. n. 581/1, correlato al mutuo assunto con Cassa DD.PP. posizione n. 4403976.01, alla quale verrà inoltrata adeguata istanza di somministrazione a perfezionamento del presente atto:

€ 18.576,04 al cap. 33240 - impegno n. 2009/4 liquidaz.provv. n. 345 con accertamento in entrata al cap. 50240, acc. n. 390/1, correlato al mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4115312.00 alla quale verranno inoltrate adeguate istanze di somministrazione;

€ 16.043,86 all'intervento 2.01.05.01, cap. 30047, RR.PP. 2004, impegno 3356/Sub 2, liquid.provv.346;

€ 3.514,35 al cap. 30585, imp.760/sub 2, liquid. Provv.347, procedendo a ridurre l'impegno di cui al sub 3 assunto con D.D. n.244/27 del 26/03/2014 da € 28.749,84 a € 24.242,40 a seguito della non applicabilità dell'IVA sulla quota DL dell'ing.V.Mansi, giusta D.D. n.666/104 del 9.9.2014 di rimodulazione del quadro economico a seguito della perizia di variante/suppletiva, e ad aumentare contestualmente per pari importo l'impegno di cui al sub 2 destinato all'impresa DE.MA Costruzioni srl che per effetto della variante da € 68.377,75 passa a € 72.885,19;

5) di dare atto che la determinazione dirigenziale n. n. 244/27 del 26/03/2014 deve intendersi rettificata nella parte relativa all'impegno di spesa che, come sopra detto, deve intendersi assunto per € 24.242,40 ed al solo cap. 30585 - impegno n. 760/sub 3, intendendosi altresì svincolato l'impegno n. 1085 - sub 1 - liq. n. 108 assunto al cap.36061 per € 879,11;

6) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata alla Sig.ra Battaglino rag. Anna in servizio presso l'ufficio Amministrativo Lavori pubblici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

Copia conforme all'originale, **13-11-14**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-11-14** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

è stata trasmessa con lettera prot. n. **25464** del **13-11-14** al Sindaco;

è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);

è divenuta esecutiva il giorno **13-11-14**.

Dal Palazzo di Città, **13-11-14**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-11-14** al **28-11-14**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-12-14**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Ufficio Realizzazione LL.PP.

Prot.n° 28798

Cerignola, 22 DIC. 2014

OGGETTO: Realizzazione nuovi loculi cimiteriali" – CUP J34H13000070004 – CIG 54408191E0 – **Impresa DE.MA Costruzioni Srl** - Contratto rep.n.153 del 29.04.2014 – **Liquidazione saldo corrispettivo 3° SAL**

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Adriano Saracino

SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 60.637,61, iva al 10% compresa, a favore dell'impresa **DE.MA Costruzioni Srl**, a titolo di saldo sul corrispettivo di complessivi € 80.195,82 alla stessa dovuto per la esecuzione dei lavori in oggetto contabilizzati al 3° SAL, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.893/149 del 13/11/2014 di approvazione del SAL e contestuale liquidazione del credito riconosciuto.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dal rappresentante legale della stessa impresa, giusta comunicazione in atti, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari in questione (art.3, comma 7 della L.136/2010).

La spesa di € 60.637,61, trova imputazione per € 18.576,04 al capitolo 33240 imp.2009 sub 4 liquidaz. 486, e per € 42.061,57 al cap.34753, imp.407/sub 1, liquid.defin.485.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Lavori Pubblici e Manutenzione
ing. Clorindo Izzillo

Si allegano:

- fattura n.13 emessa dall'impresa aggiudicataria dei lavori in data 14.11.2014;
- comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.;
- DURC impresa.

De.Ma
Costruzioni S.r.l.

Via Maddaloni, 43

71042 Cerignola (FG)

Email: demasricerignola@libero.it

Cell. 334 - 8846829

Tel. e Fax 0885 - 425966

P.Iva 01901340719

Modalità di pagamento:

bonifico bancario scad. 30 gg.

Scadenze


importi

Committente: COMUNE DI CERIGNOLA

DIRIGENTE SETTORE LLPP E MANUTENZIONE

71042 cerignola (FG)

P.IVA: 00362170714

Descrizione	Q.ta	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva	Totale
Lavori realizzazione di nuovi Loculi Cimiteriali						
3° SAL						
Atto di riferimento						72,905,29
D. D. a. 893/149 del 13/11/2014						
impegno contabile n.						
485/486/487/488/2014						
CUP: J34H13000070004						
CIG: 54408191E0;						
						
CITTÀ DI CERIGNOLA ARRIVO 17 NOV. 2014 PROT. N. 25668						
		pivaiva				
Tot. Qtà				Total Imponibile		72,905,29
				Imposta IVA 10%		7,290,53
				Totale Fattura		80,195,82

Trasporto a cura del

Porto

Banca

Causale

C/Lavorazione

Coordinate Bancarie

IT03 A010 1078 3821 0000 0002 137

Operazione effettuata senza applicazione di IVA ex art.17 c.6 DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

TUTELA DELLA PRIVACY D. Lgs. N. 196/2003: Si informa che i Vs dati anagrafici e fiscali sono inseriti nei ns archivi e vengono utilizzati per fini Amministrativi - Contabili e per ottemperare ad adempimenti connessi ad obblighi di legge.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL

14/10/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Spett.le DE.MA. COSTRUZIONI SRL
demasricerignol@libero.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE
dirigente.lpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Protocollo documento n°	32189222	del	14/10/2014
Riferimento	344/49	del	29/04/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141487676190		

Impresa	DE.MA. COSTRUZIONI SRL				
Sede legale	VIA MADDALONI 4371020 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA MADDALONI 4371020 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	01901340719	e-mail	luigi.ditommaso@consulenti- dellavoro.it	e-mail PEC	demasricerignol@libero.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00362170714 - COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA (FG) e-mail: capo.uff.lpp@comune.cerignola.fg.it e-mail PEC: dirigente.lpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI SISTEMAZIONI IN ASFALTO STRADE EXTRAURBANE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 14240964
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 21/10/2014	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	

☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3105348848
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/10/2014	
Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO	

☒ CASSA EDILE - C.E.C. FOGGIA - FG	☒ È iscritta con C.I. n° 7020
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/10/2014	
Cantiere: PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN, 71042 CERIGNOLA (FG)	
Il responsabile del procedimento CAGIANO CARMELA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dalla CASSA EDILE in data 13/11/2014


Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MARSEGLIA FRANCESCO SAVERIO



xipe B. B. B.



DE.MA. Costruzioni srl

Via Maddaloni n. 43,

71042 Cerignola (FG)

P.IVA 01901340719

Comune Cerignola

Dirigente Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Piazza della Repubblica – Cerignola

Oggetto: Lavori di “Realizzazione nuovi loculi cimiteriali” contratto rep.153 de 29/04/2014 CUP J34H13000070004 CIG 54408091E0. **Comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge 136/2010 e s.m. e i.**

Il sottoscritto Devenuto Giuseppe, nato a Cerignola il 21/05/1946 ed ivi residente alla Via Maddaloni n. 43, rappresentante legale dell’impresa DE.MA. Costruzioni srl con sede sociale in Cerignola alla Via Maddaloni n. 43, C.F. DVNGPP 46E 21C514T e P. IVA 01901340719, comunica gli estremi del c/c dedicato, in adempimento agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall’art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m. e i., relativamente ai pagamenti previsti in esecuzione dell’appalto in oggetto:

BANCO DI NAPOLI spa – Agenzia di Cerignola

Coordinate bancarie codice IBAN : IT03 A010 1078 38210000 0002137

persona delegata ad operare sul conto corrente sopra citato è lo scrivente, nella qualità di rappresentante legale dell’impresa i cui estremi sono:

DEVENUTO Giuseppe, , nato a Cerignola il 21/05/1946 ed ivi residente alla Via Maddaloni n. 43, C.F. DVNGPP 46E 21C514T


Cerignola 16/06/2014

DE.MA. Costruzioni srl

Via Maddaloni n. 43,




71042 Cerignola (FG)

P.IVA 01901340719



1948		1949		1950		1951		1952		1953		1954		1955		1956		1957		1958		1959		1960					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990	
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005	
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035	
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050	
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210

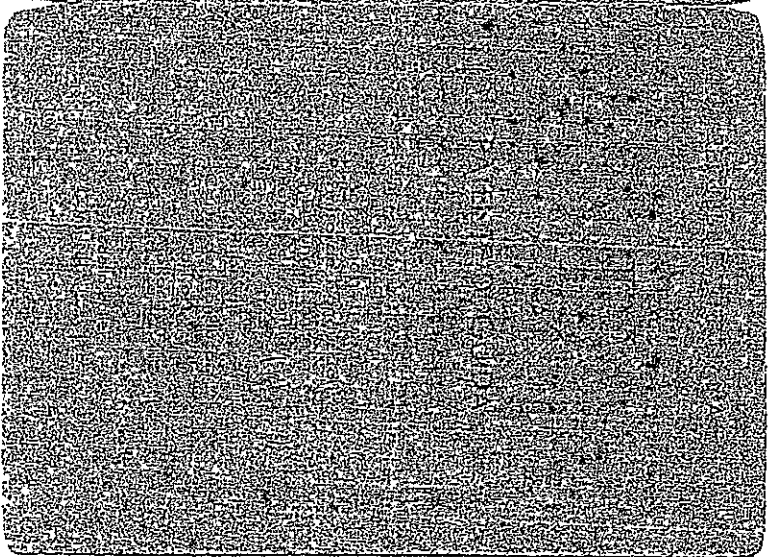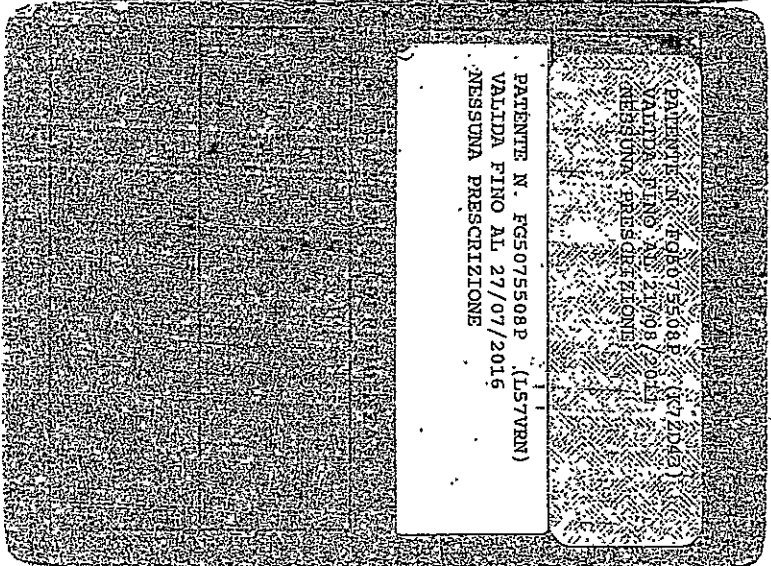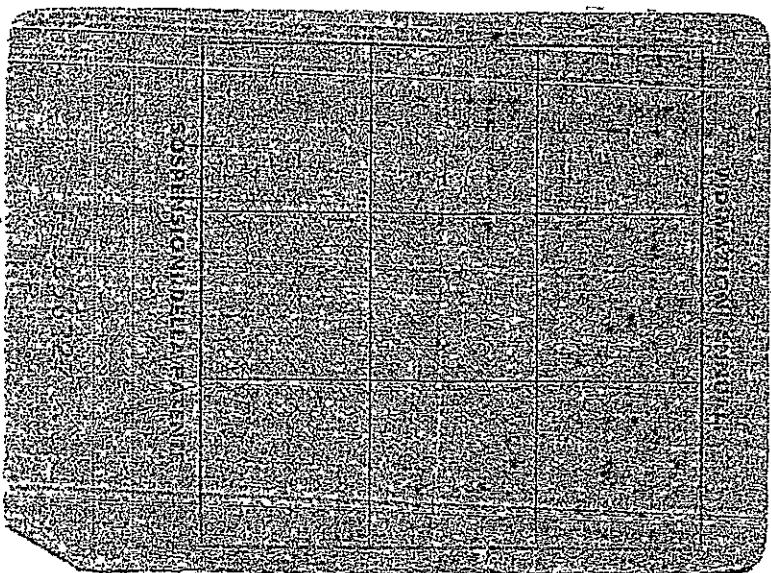



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000098950

Identificativo Pagamento: PROT. 28798/14

Importo: 60637,61 €

Codice Fiscale: 01901340719

Data Inserimento: 27/01/2015 - 11:48

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA
