

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE n° 560/93
DEL. G. R. 2007 DEL 30.12.2005

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO
I.A.C.P.
NEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA (BR)
VIA CALAMANDREI LOTTO 16

LOTTO 16°

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA :

DOTT. ING. Giuseppe DE ANGELIS

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

DOTT. ARCH. Gianluca TUCCI

**COORDINATORE SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

GEOM. Rocco CAFORIO

COLLABORAZIONE TECNICA:

GEOM. Ferdinando DEL PRETE

GEOM. Rocco CAFORIO

DATA : Novembre 2006

SCALA :

ARCHIVIO :

CRONOPROGRAMMA

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio IACP nel
Comune di Francavilla Fontana (Br) lotto 16° via Calamandrei.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 22/11/2006

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)


ID	Nome attività	Durata	Importo	marzo 2007												
				05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
1	allestimento cantiere	14 g	0.00													
2	Montaggio di impalcatura	35 g	36 540.00													
3	Demolizione di conglomerati cementizi	49 g	2 922.00													
4	F. e p.o. di betoncino per risanamento strutture	49 g	130.90													
5	Copertina in calcestruzzo	49 g	2 509.08													
6	Spalmatura verice bituminosa	21 g	180.00													
7	Spicconatura di intonaci	105 g	19 106.88													
8	Rivestimento di facciate esterne	105 g	129 173.28													
9	Smontaggio, rimozione e f. e p.o. di pluviali	21 g	4 093.20													
10	Coprigiunti	21 g	988.00													
11	Verniciatura di infissi in ferro	28 g	3 077.54													
12	Pitturazione di sottobalconi esterni	28 g	1 281.17													
13	Smontaggio impalcatura	28 g	0.00													
14	Smobilizzo cantiere	14 g	0.00													
			220 000													
			210 000													
			200 000													
			190 000													
			180 000													
			170 000													
			160 000													
			150 000													
			140 000													
			130 000													
			120 000													
			110 000													
			100 000													
			90 000													
			80 000													
			70 000													
			60 000													
			50 000													
			40 000													
			30 000													
			20 000													
			10 000													
			0													

[illegible]

[illegible]

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

[illegible]



Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

Tabella Attività

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio IACP nel
Comune di Francavilla Fontana (Br) lotto 16° via Calamandrei.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 22/11/2006

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

ATTIVITA'	PREVISTO			Inizio	Fine	GIORNI	
	lire	euro	(%)			Lav.	Tot.
allestimento cantiere	0.00	0.00	0.00	05/03/2007	18/03/2007	14	14
Montaggio di impalcatura	36 540.00	18.87	18.27	19/03/2007	22/04/2007	35	35
Demolizione di conglomerati cementizi	2 922.00	1.51	1.46	23/04/2007	10/06/2007	49	49
F. e p.o. di betoncino per risanamento strutture	130.90	0.07	0.07	23/04/2007	10/06/2007	49	49
Copertina in calcestruzzo	2 509.08	1.30	1.25	23/04/2007	10/06/2007	49	49
Spalmatura verice bituminosa	180.00	0.09	0.09	11/06/2007	01/07/2007	21	21
Spicconatura di intonaci	19 106.88	9.87	9.55	02/07/2007	14/10/2007	105	105
Rivestimento di facciate esterne	129 173.28	66.71	64.59	02/07/2007	14/10/2007	105	105
Smontaggio, rimozione e f. e p.o. di pluviali	4 093.20	2.11	2.05	15/10/2007	04/11/2007	21	21
Coprigiunti	988.00	0.51	0.49	05/11/2007	25/11/2007	21	21
Verniciatura di infissi in ferro	3 077.54	1.59	1.54	26/11/2007	23/12/2007	28	28
Pitturazione di sottobalconi esterni	1 281.17	0.66	0.64	24/12/2007	20/01/2008	28	28
Smontaggio impalcatura	0.00	0.00	0.00	21/01/2008	17/02/2008	28	28
Smobilizzo cantiere	0.00	0.00	0.00	18/02/2008	02/03/2008	14	14
Brindisi, 22/11/2006							
il Tecnico geom. Rocco CAFORIO							

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio IACP nel
Comune di Francavilla Fontana (Br) lotto 16° via Calamandrei.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 22/11/2006

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale lire	Parziale euro	Progressivo lire	Progressivo euro	(%)
19/03/2007	1 044.00	0.54	1 044.00	0.54	0.52
20/03/2007	1 044.00	0.54	2 088.00	1.08	1.04
21/03/2007	1 044.00	0.54	3 132.00	1.62	1.57
22/03/2007	1 044.00	0.54	4 176.00	2.16	2.09
23/03/2007	1 044.00	0.54	5 220.00	2.70	2.61
24/03/2007	1 044.00	0.54	6 264.00	3.24	3.13
25/03/2007	1 044.00	0.54	7 308.00	3.77	3.65
26/03/2007	1 044.00	0.54	8 352.00	4.31	4.18
27/03/2007	1 044.00	0.54	9 396.00	4.85	4.70
28/03/2007	1 044.00	0.54	10 440.00	5.39	5.22
29/03/2007	1 044.00	0.54	11 484.00	5.93	5.74
30/03/2007	1 044.00	0.54	12 528.00	6.47	6.26
31/03/2007	1 044.00	0.54	13 572.00	7.01	6.79
01/04/2007	1 044.00	0.54	14 616.00	7.55	7.31
02/04/2007	1 044.00	0.54	15 660.00	8.09	7.83
03/04/2007	1 044.00	0.54	16 704.00	8.63	8.35
04/04/2007	1 044.00	0.54	17 748.00	9.17	8.87
05/04/2007	1 044.00	0.54	18 792.00	9.71	9.40
06/04/2007	1 044.00	0.54	19 836.00	10.24	9.92
07/04/2007	1 044.00	0.54	20 880.00	10.78	10.44
08/04/2007	1 044.00	0.54	21 924.00	11.32	10.96
09/04/2007	1 044.00	0.54	22 968.00	11.86	11.48
10/04/2007	1 044.00	0.54	24 012.00	12.40	12.01
11/04/2007	1 044.00	0.54	25 056.00	12.94	12.53
12/04/2007	1 044.00	0.54	26 100.00	13.48	13.05
13/04/2007	1 044.00	0.54	27 144.00	14.02	13.57
14/04/2007	1 044.00	0.54	28 188.00	14.56	14.09
15/04/2007	1 044.00	0.54	29 232.00	15.10	14.62
16/04/2007	1 044.00	0.54	30 276.00	15.64	15.14
17/04/2007	1 044.00	0.54	31 320.00	16.18	15.66
18/04/2007	1 044.00	0.54	32 364.00	16.71	16.18
19/04/2007	1 044.00	0.54	33 408.00	17.25	16.70
20/04/2007	1 044.00	0.54	34 452.00	17.79	17.23
21/04/2007	1 044.00	0.54	35 496.00	18.33	17.75
22/04/2007	1 044.00	0.54	36 540.00	18.87	18.27
23/04/2007	113.51	0.06	36 653.51	18.93	18.33
24/04/2007	113.51	0.06	36 767.02	18.99	18.38
25/04/2007	113.51	0.06	36 880.53	19.05	18.44
26/04/2007	113.51	0.06	36 994.04	19.11	18.50
27/04/2007	113.51	0.06	37 107.55	19.16	18.55
28/04/2007	113.51	0.06	37 221.06	19.22	18.61
29/04/2007	113.51	0.06	37 334.57	19.28	18.67
30/04/2007	113.51	0.06	37 448.08	19.34	18.72
01/05/2007	113.51	0.06	37 561.59	19.40	18.78
02/05/2007	113.51	0.06	37 675.10	19.46	18.84
03/05/2007	113.51	0.06	37 788.61	19.52	18.89
04/05/2007	113.51	0.06	37 902.12	19.57	18.95
05/05/2007	113.51	0.06	38 015.63	19.63	19.01
06/05/2007	113.51	0.06	38 129.14	19.69	19.06
07/05/2007	113.51	0.06	38 242.65	19.75	19.12
08/05/2007	113.51	0.06	38 356.16	19.81	19.18
09/05/2007	113.51	0.06	38 469.67	19.87	19.23
10/05/2007	113.51	0.06	38 583.18	19.93	19.29
11/05/2007	113.51	0.06	38 696.69	19.99	19.35
12/05/2007	113.51	0.06	38 810.20	20.04	19.40
13/05/2007	113.51	0.06	38 923.71	20.10	19.46
14/05/2007	113.51	0.06	39 037.22	20.16	19.52
15/05/2007	113.51	0.06	39 150.73	20.22	19.58
16/05/2007	113.51	0.06	39 264.24	20.28	19.63
17/05/2007	113.51	0.06	39 377.74	20.34	19.69
18/05/2007	113.51	0.06	39 491.25	20.40	19.75
19/05/2007	113.51	0.06	39 604.76	20.45	19.80
20/05/2007	113.51	0.06	39 718.27	20.51	19.86
21/05/2007	113.51	0.06	39 831.78	20.57	19.92
22/05/2007	113.51	0.06	39 945.29	20.63	19.97
23/05/2007	113.51	0.06	40 058.80	20.69	20.03
24/05/2007	113.51	0.06	40 172.31	20.75	20.09
25/05/2007	113.51	0.06	40 285.82	20.81	20.14

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale lire	Parziale euro	Progressivo lire	Progressivo euro	(%)
26/05/2007	113.51	0.06	40 399.33	20.86	20.20
27/05/2007	113.51	0.06	40 512.84	20.92	20.26
28/05/2007	113.51	0.06	40 626.35	20.98	20.31
29/05/2007	113.51	0.06	40 739.86	21.04	20.37
30/05/2007	113.51	0.06	40 853.37	21.10	20.43
31/05/2007	113.51	0.06	40 966.88	21.16	20.48
01/06/2007	113.51	0.06	41 080.39	21.22	20.54
02/06/2007	113.51	0.06	41 193.90	21.27	20.60
03/06/2007	113.51	0.06	41 307.41	21.33	20.65
04/06/2007	113.51	0.06	41 420.92	21.39	20.71
05/06/2007	113.51	0.06	41 534.43	21.45	20.77
06/06/2007	113.51	0.06	41 647.94	21.51	20.82
07/06/2007	113.51	0.06	41 761.45	21.57	20.88
08/06/2007	113.51	0.06	41 874.96	21.63	20.94
09/06/2007	113.51	0.06	41 988.47	21.69	20.99
10/06/2007	113.51	0.06	42 101.98	21.74	21.05
11/06/2007	8.57	0.00	42 110.55	21.75	21.06
12/06/2007	8.57	0.00	42 119.12	21.75	21.06
13/06/2007	8.57	0.00	42 127.69	21.76	21.06
14/06/2007	8.57	0.00	42 136.27	21.76	21.07
15/06/2007	8.57	0.00	42 144.84	21.77	21.07
16/06/2007	8.57	0.00	42 153.41	21.77	21.08
17/06/2007	8.57	0.00	42 161.98	21.77	21.08
18/06/2007	8.57	0.00	42 170.55	21.78	21.09
19/06/2007	8.57	0.00	42 179.12	21.78	21.09
20/06/2007	8.57	0.00	42 187.69	21.79	21.09
21/06/2007	8.57	0.00	42 196.27	21.79	21.10
22/06/2007	8.57	0.00	42 204.84	21.80	21.10
23/06/2007	8.57	0.00	42 213.41	21.80	21.11
24/06/2007	8.57	0.00	42 221.98	21.81	21.11
25/06/2007	8.57	0.00	42 230.55	21.81	21.12
26/06/2007	8.57	0.00	42 239.12	21.81	21.12
27/06/2007	8.57	0.00	42 247.69	21.82	21.12
28/06/2007	8.57	0.00	42 256.27	21.82	21.13
29/06/2007	8.57	0.00	42 264.84	21.83	21.13
30/06/2007	8.57	0.00	42 273.41	21.83	21.14
01/07/2007	8.57	0.00	42 281.98	21.84	21.14
02/07/2007	1 412.19	0.73	43 694.17	22.57	21.85
03/07/2007	1 412.19	0.73	45 106.36	23.30	22.55
04/07/2007	1 412.19	0.73	46 518.56	24.02	23.26
05/07/2007	1 412.19	0.73	47 930.75	24.75	23.97
06/07/2007	1 412.19	0.73	49 342.94	25.48	24.67
07/07/2007	1 412.19	0.73	50 755.13	26.21	25.38
08/07/2007	1 412.19	0.73	52 167.32	26.94	26.08
09/07/2007	1 412.19	0.73	53 579.52	27.67	26.79
10/07/2007	1 412.19	0.73	54 991.71	28.40	27.50
11/07/2007	1 412.19	0.73	56 403.90	29.13	28.20
12/07/2007	1 412.19	0.73	57 816.09	29.86	28.91
13/07/2007	1 412.19	0.73	59 228.28	30.59	29.61
14/07/2007	1 412.19	0.73	60 640.48	31.32	30.32
15/07/2007	1 412.19	0.73	62 052.67	32.05	31.03
16/07/2007	1 412.19	0.73	63 464.86	32.78	31.73
17/07/2007	1 412.19	0.73	64 877.05	33.51	32.44
18/07/2007	1 412.19	0.73	66 289.24	34.24	33.14
19/07/2007	1 412.19	0.73	67 701.44	34.96	33.85
20/07/2007	1 412.19	0.73	69 113.63	35.69	34.56
21/07/2007	1 412.19	0.73	70 525.82	36.42	35.26
22/07/2007	1 412.19	0.73	71 938.01	37.15	35.97
23/07/2007	1 412.19	0.73	73 350.20	37.88	36.67
24/07/2007	1 412.19	0.73	74 762.40	38.61	37.38
25/07/2007	1 412.19	0.73	76 174.59	39.34	38.09
26/07/2007	1 412.19	0.73	77 586.78	40.07	38.79
27/07/2007	1 412.19	0.73	78 998.97	40.80	39.50
28/07/2007	1 412.19	0.73	80 411.16	41.53	40.21
29/07/2007	1 412.19	0.73	81 823.36	42.26	40.91
30/07/2007	1 412.19	0.73	83 235.55	42.99	41.62
31/07/2007	1 412.19	0.73	84 647.74	43.72	42.32
01/08/2007	1 412.19	0.73	86 059.93	44.45	43.03

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale lire	Parziale euro	Progressivo lire	Progressivo euro	(%)
02/08/2007	1 412.19	0.73	87 472.12	45.18	43.74
03/08/2007	1 412.19	0.73	88 884.32	45.90	44.44
04/08/2007	1 412.19	0.73	90 296.51	46.63	45.15
05/08/2007	1 412.19	0.73	91 708.70	47.36	45.85
06/08/2007	1 412.19	0.73	93 120.89	48.09	46.56
07/08/2007	1 412.19	0.73	94 533.08	48.82	47.27
08/08/2007	1 412.19	0.73	95 945.28	49.55	47.97
09/08/2007	1 412.19	0.73	97 357.47	50.28	48.68
10/08/2007	1 412.19	0.73	98 769.66	51.01	49.38
11/08/2007	1 412.19	0.73	100 181.85	51.74	50.09
12/08/2007	1 412.19	0.73	101 594.04	52.47	50.80
13/08/2007	1 412.19	0.73	103 006.24	53.20	51.50
14/08/2007	1 412.19	0.73	104 418.43	53.93	52.21
15/08/2007	1 412.19	0.73	105 830.62	54.66	52.91
16/08/2007	1 412.19	0.73	107 242.81	55.39	53.62
17/08/2007	1 412.19	0.73	108 655.00	56.12	54.33
18/08/2007	1 412.19	0.73	110 067.20	56.84	55.03
19/08/2007	1 412.19	0.73	111 479.39	57.57	55.74
20/08/2007	1 412.19	0.73	112 891.58	58.30	56.45
21/08/2007	1 412.19	0.73	114 303.77	59.03	57.15
22/08/2007	1 412.19	0.73	115 715.96	59.76	57.86
23/08/2007	1 412.19	0.73	117 128.16	60.49	58.56
24/08/2007	1 412.19	0.73	118 540.35	61.22	59.27
25/08/2007	1 412.19	0.73	119 952.54	61.95	59.98
26/08/2007	1 412.19	0.73	121 364.73	62.68	60.68
27/08/2007	1 412.19	0.73	122 776.92	63.41	61.39
28/08/2007	1 412.19	0.73	124 189.12	64.14	62.09
29/08/2007	1 412.19	0.73	125 601.31	64.87	62.80
30/08/2007	1 412.19	0.73	127 013.50	65.60	63.51
31/08/2007	1 412.19	0.73	128 425.69	66.33	64.21
01/09/2007	1 412.19	0.73	129 837.88	67.06	64.92
02/09/2007	1 412.19	0.73	131 250.08	67.79	65.62
03/09/2007	1 412.19	0.73	132 662.27	68.51	66.33
04/09/2007	1 412.19	0.73	134 074.46	69.24	67.04
05/09/2007	1 412.19	0.73	135 486.65	69.97	67.74
06/09/2007	1 412.19	0.73	136 898.84	70.70	68.45
07/09/2007	1 412.19	0.73	138 311.04	71.43	69.15
08/09/2007	1 412.19	0.73	139 723.23	72.16	69.86
09/09/2007	1 412.19	0.73	141 135.42	72.89	70.57
10/09/2007	1 412.19	0.73	142 547.61	73.62	71.27
11/09/2007	1 412.19	0.73	143 959.80	74.35	71.98
12/09/2007	1 412.19	0.73	145 372.00	75.08	72.69
13/09/2007	1 412.19	0.73	146 784.19	75.81	73.39
14/09/2007	1 412.19	0.73	148 196.38	76.54	74.10
15/09/2007	1 412.19	0.73	149 608.57	77.27	74.80
16/09/2007	1 412.19	0.73	151 020.76	78.00	75.51
17/09/2007	1 412.19	0.73	152 432.96	78.73	76.22
18/09/2007	1 412.19	0.73	153 845.15	79.45	76.92
19/09/2007	1 412.19	0.73	155 257.34	80.18	77.63
20/09/2007	1 412.19	0.73	156 669.53	80.91	78.33
21/09/2007	1 412.19	0.73	158 081.72	81.64	79.04
22/09/2007	1 412.19	0.73	159 493.92	82.37	79.75
23/09/2007	1 412.19	0.73	160 906.11	83.10	80.45
24/09/2007	1 412.19	0.73	162 318.30	83.83	81.16
25/09/2007	1 412.19	0.73	163 730.49	84.56	81.86
26/09/2007	1 412.19	0.73	165 142.68	85.29	82.57
27/09/2007	1 412.19	0.73	166 554.88	86.02	83.28
28/09/2007	1 412.19	0.73	167 967.07	86.75	83.98
29/09/2007	1 412.19	0.73	169 379.26	87.48	84.69
30/09/2007	1 412.19	0.73	170 791.45	88.21	85.39
01/10/2007	1 412.19	0.73	172 203.64	88.94	86.10
02/10/2007	1 412.19	0.73	173 615.84	89.67	86.81
03/10/2007	1 412.19	0.73	175 028.03	90.39	87.51
04/10/2007	1 412.19	0.73	176 440.22	91.12	88.22
05/10/2007	1 412.19	0.73	177 852.41	91.85	88.93
06/10/2007	1 412.19	0.73	179 264.60	92.58	89.63
07/10/2007	1 412.19	0.73	180 676.80	93.31	90.34
08/10/2007	1 412.19	0.73	182 088.99	94.04	91.04

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale lire	Parziale euro	Progressivo lire	Progressivo euro	(%)
09/10/2007	1 412.19	0.73	183 501.18	94.77	91.75
10/10/2007	1 412.19	0.73	184 913.37	95.50	92.46
11/10/2007	1 412.19	0.73	186 325.56	96.23	93.16
12/10/2007	1 412.19	0.73	187 737.76	96.96	93.87
13/10/2007	1 412.19	0.73	189 149.95	97.69	94.57
14/10/2007	1 412.19	0.73	190 562.14	98.42	95.28
15/10/2007	194.91	0.10	190 757.05	98.52	95.38
16/10/2007	194.91	0.10	190 951.97	98.62	95.48
17/10/2007	194.91	0.10	191 146.88	98.72	95.57
18/10/2007	194.91	0.10	191 341.80	98.82	95.67
19/10/2007	194.91	0.10	191 536.71	98.92	95.77
20/10/2007	194.91	0.10	191 731.63	99.02	95.86
21/10/2007	194.91	0.10	191 926.54	99.12	95.96
22/10/2007	194.91	0.10	192 121.45	99.22	96.06
23/10/2007	194.91	0.10	192 316.37	99.32	96.16
24/10/2007	194.91	0.10	192 511.28	99.42	96.25
25/10/2007	194.91	0.10	192 706.20	99.52	96.35
26/10/2007	194.91	0.10	192 901.11	99.63	96.45
27/10/2007	194.91	0.10	193 096.03	99.73	96.55
28/10/2007	194.91	0.10	193 290.94	99.83	96.64
29/10/2007	194.91	0.10	193 485.85	99.93	96.74
30/10/2007	194.91	0.10	193 680.77	100.03	96.84
31/10/2007	194.91	0.10	193 875.68	100.13	96.94
01/11/2007	194.91	0.10	194 070.60	100.23	97.03
02/11/2007	194.91	0.10	194 265.51	100.33	97.13
03/11/2007	194.91	0.10	194 460.43	100.43	97.23
04/11/2007	194.91	0.10	194 655.34	100.53	97.33
05/11/2007	47.05	0.02	194 702.39	100.56	97.35
06/11/2007	47.05	0.02	194 749.44	100.58	97.37
07/11/2007	47.05	0.02	194 796.48	100.60	97.40
08/11/2007	47.05	0.02	194 843.53	100.63	97.42
09/11/2007	47.05	0.02	194 890.58	100.65	97.44
10/11/2007	47.05	0.02	194 937.63	100.68	97.47
11/11/2007	47.05	0.02	194 984.67	100.70	97.49
12/11/2007	47.05	0.02	195 031.72	100.73	97.51
13/11/2007	47.05	0.02	195 078.77	100.75	97.54
14/11/2007	47.05	0.02	195 125.82	100.77	97.56
15/11/2007	47.05	0.02	195 172.86	100.80	97.59
16/11/2007	47.05	0.02	195 219.91	100.82	97.61
17/11/2007	47.05	0.02	195 266.96	100.85	97.63
18/11/2007	47.05	0.02	195 314.01	100.87	97.66
19/11/2007	47.05	0.02	195 361.05	100.90	97.68
20/11/2007	47.05	0.02	195 408.10	100.92	97.70
21/11/2007	47.05	0.02	195 455.15	100.94	97.73
22/11/2007	47.05	0.02	195 502.20	100.97	97.75
23/11/2007	47.05	0.02	195 549.24	100.99	97.77
24/11/2007	47.05	0.02	195 596.29	101.02	97.80
25/11/2007	47.05	0.02	195 643.34	101.04	97.82
26/11/2007	109.91	0.06	195 753.25	101.10	97.88
27/11/2007	109.91	0.06	195 863.16	101.15	97.93
28/11/2007	109.91	0.06	195 973.08	101.21	97.99
29/11/2007	109.91	0.06	196 082.99	101.27	98.04
30/11/2007	109.91	0.06	196 192.90	101.33	98.10
01/12/2007	109.91	0.06	196 302.81	101.38	98.15
02/12/2007	109.91	0.06	196 412.73	101.44	98.21
03/12/2007	109.91	0.06	196 522.64	101.50	98.26
04/12/2007	109.91	0.06	196 632.55	101.55	98.32
05/12/2007	109.91	0.06	196 742.46	101.61	98.37
06/12/2007	109.91	0.06	196 852.37	101.67	98.43
07/12/2007	109.91	0.06	196 962.29	101.72	98.48
08/12/2007	109.91	0.06	197 072.20	101.78	98.54
09/12/2007	109.91	0.06	197 182.11	101.84	98.59
10/12/2007	109.91	0.06	197 292.02	101.89	98.64
11/12/2007	109.91	0.06	197 401.93	101.95	98.70
12/12/2007	109.91	0.06	197 511.85	102.01	98.75
13/12/2007	109.91	0.06	197 621.76	102.06	98.81
14/12/2007	109.91	0.06	197 731.67	102.12	98.86
15/12/2007	109.91	0.06	197 841.58	102.18	98.92

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale lire	Parziale euro	Progressivo lire	Progressivo euro	(%)
16/12/2007	109.91	0.06	197 951.50	102.23	98.97
17/12/2007	109.91	0.06	198 061.41	102.29	99.03
18/12/2007	109.91	0.06	198 171.32	102.35	99.08
19/12/2007	109.91	0.06	198 281.23	102.40	99.14
20/12/2007	109.91	0.06	198 391.14	102.46	99.19
21/12/2007	109.91	0.06	198 501.06	102.52	99.25
22/12/2007	109.91	0.06	198 610.97	102.57	99.30
23/12/2007	109.91	0.06	198 720.88	102.63	99.36
24/12/2007	45.76	0.02	198 766.64	102.65	99.38
25/12/2007	45.76	0.02	198 812.39	102.68	99.41
26/12/2007	45.76	0.02	198 858.15	102.70	99.43
27/12/2007	45.76	0.02	198 903.90	102.73	99.45
28/12/2007	45.76	0.02	198 949.66	102.75	99.47
29/12/2007	45.76	0.02	198 995.42	102.77	99.50
30/12/2007	45.76	0.02	199 041.17	102.80	99.52
31/12/2007	45.76	0.02	199 086.93	102.82	99.54
01/01/2008	45.76	0.02	199 132.68	102.84	99.57
02/01/2008	45.76	0.02	199 178.44	102.87	99.59
03/01/2008	45.76	0.02	199 224.20	102.89	99.61
04/01/2008	45.76	0.02	199 269.95	102.91	99.63
05/01/2008	45.76	0.02	199 315.71	102.94	99.66
06/01/2008	45.76	0.02	199 361.47	102.96	99.68
07/01/2008	45.76	0.02	199 407.22	102.99	99.70
08/01/2008	45.76	0.02	199 452.98	103.01	99.73
09/01/2008	45.76	0.02	199 498.73	103.03	99.75
10/01/2008	45.76	0.02	199 544.49	103.06	99.77
11/01/2008	45.76	0.02	199 590.25	103.08	99.79
12/01/2008	45.76	0.02	199 636.00	103.10	99.82
13/01/2008	45.76	0.02	199 681.76	103.13	99.84
14/01/2008	45.76	0.02	199 727.51	103.15	99.86
15/01/2008	45.76	0.02	199 773.27	103.17	99.89
16/01/2008	45.76	0.02	199 819.03	103.20	99.91
17/01/2008	45.76	0.02	199 864.78	103.22	99.93
18/01/2008	45.76	0.02	199 910.54	103.25	99.95
19/01/2008	45.76	0.02	199 956.29	103.27	99.98
20/01/2008	45.76	0.02	200 002.05	103.29	100.00
Brindisi, 22/11/2006					
il Tecnico geom. Rocco CAFORIO					

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio IACP nel
Comune di Francavilla Fontana (Br) lotto 16° via Calamandrei.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 22/11/2006

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Brindisi

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio IACP nel Comune di Francavilla Fontana (Br) lotto 16° via Calamandrei.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, è stato redatto ai sensi dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **364** giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	díc	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di lire 16'712.63 euro 8.63 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di lire 43'777.95 euro 22.61.

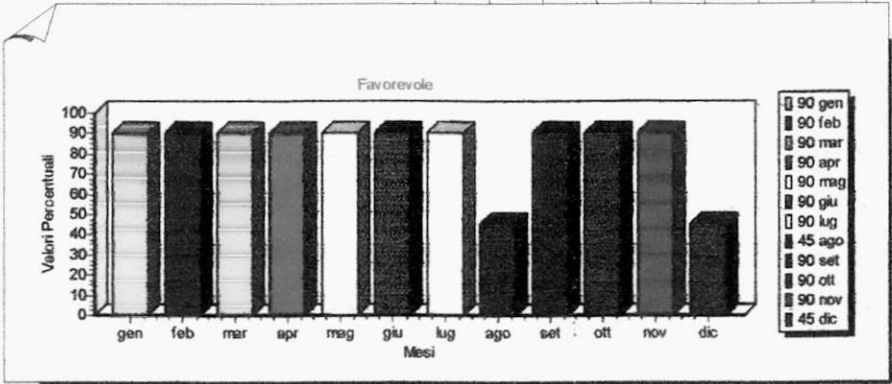
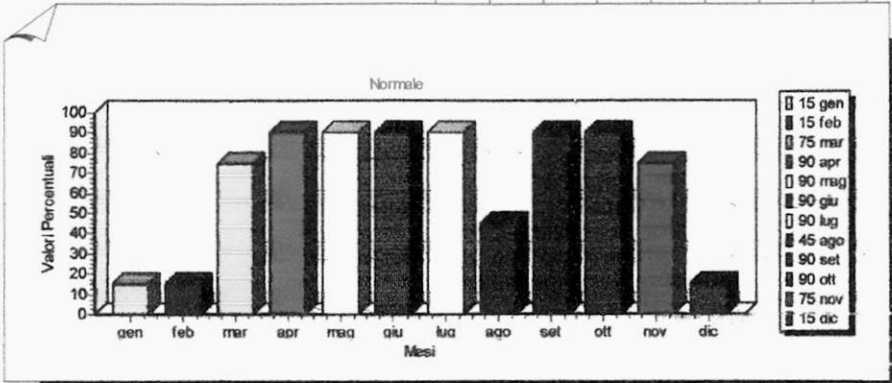
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

Brindisi, 22/11/2006

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

DESCRIZIONE	VALORE
Tipologia Documento	Cronoprogramma
Comune	Istituto Autonomo Case Popolari
Provincia	Provincia di Brindisi
Oggetto	Lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio IACP nel Comune di Francavilla Fontana (Br) lotto 16° via Calamandrei.
Committente	I.A.C.P. Brindisi
Tecnico	geom. Rocco CAFORIO
Impresa	
Luogo	Brindisi
Data	22/11/2006
Importo per l'emissione dei SAL	20'000.00

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

DESCRIZIONE	Mesi												Media
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
TABELLE CLIMATICO AMBIENTALI													
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.50
													
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65.00
													
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75
