



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3472


del 12-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	31965	Art.	0	Codice di bilancio	205010100	Gestione	RESIDUI/2013
RIQUALIFICAZIONE SISTEMA MUSEALE - TORRE ALEMANNA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE LL. PP. MANUT.	nr. 520	del. 16-07-2015
numero 293 del 15-07-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
PO FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea 4.2 - Azione 4.2.1. - Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemanna - Approvazione 2° stato di avanzamento delle forniture e servizi connessi all'allestimento e attivazione del museo.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA	690.687,00	1.153.500,56	
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		PRECEDENTI PAGAMENTI	241.740,45	392.561,61	
Servizio	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		PRESENTE IMPORTO	152.055,60	152.055,60	
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO	393.796,05	544.617,21	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	296.890,95	608.883,35	
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI				Fruttifero	C.U.P. J33D13000200002
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 152.055,60 dicensi CENTOCINQUANTADUEMILACINQUANTACINQUE/60							
Per : PO FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea 4.2 - Azione 4.2.1. - Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemanna - Approvazione 2° stato di avanzamento delle forniture e servizi connessi all'allestimento e attivazione del museo.							

CREDITORE (Codice: 14052)				
BAWER S.P.A.		VIA SOLFERINO, 4		
Cod.Fis. 05593210726 / P.Iva 05593210726		70022 ALTAMURA (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:53704993F9 SALDO Fatt.n. 5 del 15/07/2015 Forniture e servizi connessi all'allestimento e attivazione del Museo di Torre Alemanna. Istato avanzamento lavori		152.055,60	2113
	Trib. 0025 IVA PARTE CAPITALE 22,00% su 124.636,00 *Ritenuta		27.419,86	
	Netto da Pagare:		124.635,74	124.635,74
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	27.419,86
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA APULIA (IT75R0578741330007570039750 - CIN: R - ABI: 05787 - CAB: 41330 - C/C: 007570039750 IBAN: IT75R0578741330007570039750			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3672 CAP. 31965 BIL. 2013

IMPEGNO N. / LIQUIDAZIONE N. 293

IMPONIBILE € 124.635,74
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 24.419,86
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 152.055,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2863

CREDITORE: COD.N. (16052) BAWER SPA

PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 15/07/15

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: FORNITURE E SERVIZI CONNESSI ALL'AUESTM.
E ATTIVAZIONE DEL FLUSO DI FORTE ALFMANNA. 2° STATO AV.
LAURI

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 53704993F9 CUP: J 33 D13000200002

SIOPE: 2113

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 520/123 del 2015

3163
14052

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 18801218

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 5

Anno Fattura: 2015

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

Ind. 25165 M 1.10.2015

Bauer

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
 Progressivo di invio: 70786
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05593210726
 Codice fiscale: 05593210726
 Denominazione: **BAWER S.p.A.**
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via A.Antica Km 13.100
 CAP: 75100
 Comune: MATERA
 Provincia: MT
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
 Numero di iscrizione: 427298
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0835245911
 Fax: 0835245935
 E-mail: info@bawer.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: CITTA' DI CERIGNOLA (PROVINCIA DI FOGGIA)


Dati della sede

Indirizzo: P.zza della Repubblica
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Città di
 Cerignola
 Progetto di legge dalla
 Regione Puglia del

ASSE IV - LINEA 4.2 - Az. 4.2.1 H.D.
 PER L'INTERCOMPORTO B. 7.152.055,60
 IL DIRETTORE AL SERVIZIO
 REALIZZAZIONE LL.PP.

(dott. Ing. Clelio IZZILLO)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-07-15 (15 Luglio 2015)
Numero documento: 5
Importo totale documento: 152055.60

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: EMETTIAMO FATTURA PER 2° STATO DI AVANZAMENTO FORNITURE E
SERVIZI CONNESSI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ALL'ALLESTIMENTO E ALL'ATTIVAZIONE DEL MUSEO DI TORRE
ALEMANNA
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: "ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.520/123 DEL 16/07/2015"
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: "IMPEGNO CONTABILE: CAPITOLO 31965 LIQUIDAZIONE N.293"
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: ***CIG: 53704993F9 - CUP: J33D13000200002***
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Prestazione al lordo del ribasso
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 292140.00000000
Valore totale: 292140.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Ribasso (12,766%)
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: -36933.53000000
Valore totale: -36933.53000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: Ritenuta 0,5%
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: -1276.03000000
Valore totale: -1276.03000000
IVA (%): 22.00



Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **A detrarre Ns. Fat.351/V del 26/02/15**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **-80634.70000000**
Valore totale: **-80634.70000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **A detrarre Ns. Fat.352/V del 26/02/15**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **-48660.00000000**
Valore totale: **-48660.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **124635.74**
Totale imposta: **27419.86**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
Data scadenza pagamento: **2015-07-15** (15 Luglio 2015)
Importo: **124635.74**
Istituto finanziario: **BANCAPULIA**
Codice IBAN: **IT75R0578741330007570039750**
Codice ABI: **05787**
Codice CAB: **41330**
Codice BIC: **APULIT31XXX**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **tracciabilità_torre_alemanna.pdf**
Formato: **PDF**

Nome dell'allegato: **DURC_03-06-2015.pdf**
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.520/123

In data 16-07-15

OGGETTO: PO FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea 4.2 - Azione 4.2.1. - Riqualficazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemanna - Approvazione 2' stato di avanzamento delle forniture e servizi connessi all'allestimento e attivazione del museo.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sedici** del mese di **luglio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-07-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Mastroserio ING. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«La Regione Puglia con deliberazione n. 2947 del 29/12/2011, ha approvato un bando pubblico per la selezione di interventi mirati al rafforzamento ed alla valorizzazione della rete dei musei pugliesi, destinando allo scopo risorse nell'ambito dell'Asse IV del PO FESR 2007-2013 - Azione 4.2.1 D - Linea 4.2.

Il Comune di Cerignola, proprietario di una struttura museale, "Torre Alemanna" con destinazione a Centro internazionale di studi e museo, in corso di completamento e attivazione, già destinataria di finanziamenti regionali, con atto G.C. n. 60 del 21/2/2012 ha aderito al suddetto bando Regionale, demandando all'ing. Clorindo Izzillo, a suo tempo Dirigente del Settore Lavori pubblici e Manutenzione, tutte le attività tecnico-amministrative ed attivazione delle procedure per la presentazione dell'istanza di ammissione a finanziamento per la ristrutturazione della stessa, mirata all'allestimento e all'attivazione del museo.

Pertanto, con determinazione dirigenziale n.223/38 del 16.03.2012, è stato affidato all'arch. Vincenzo Russo, l'incarico per la redazione di tutti gli atti tecnico-amministrativi, nonché del progetto esecutivo, comprensivo del piano di sicurezza in fase di progettazione, necessari per la partecipazione al bando e l'accesso ai finanziamenti PO FESR 2007-2013 - Asse IV, Linea 4.2, Azione 4.2.1. D - "Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale", per "Istituzioni museali in corso di attivazione", presso la struttura comunale di "Torre Alemanna".

Con deliberazione G.C. n. 111 del 22.03.2012 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'arch. Vincenzo Russo (favorevolmente vistato dalle Soprintendenze per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Puglia - Bari in data 19.03.2012 con prot.1705 e per i Beni Archeologici della Puglia Taranto), dell'importo di € 844.458,36, inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2012-2014 e finanziabile per € 778.821,76 attraverso l'accesso ai finanziamenti della Regione Puglia e per € 65.636,60, quale quota di compartecipazione, con fondi di questo Comune, giusto impegno assunto all'intervento 2.01.05.01, cap. 30585, bilancio 2011 - impegno 588/11 (di € 100.000,00).

Con deliberazione G.C. n. 221 del 25.06.2013 è stato approvato il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e questo soggetto beneficiario, trasmesso dalla Regione Puglia con nota A00-058 prot. 1803/1 dell'11.06.2013, acquisita il 13/06/2013 al protocollo n. 14563, al fine di assicurare la corretta attuazione dell'intervento di "Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale" ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 844.458,36.

Con determina contrarre n. 719/126 del 10/10/2013 è stato approvato il bando di gara, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006; nel termine prescritto dello ore 12,00 del 25.11.2013 sono pervenuti n.2 plichi.

Alla gara, come da verbale in atti, sono state ammesse entrambe le ditte.

Preso atto dei verbali del 26/11/2013, 03/12/2013, 05/12/2013, 12/12/2013, in atti d'ufficio e il verbale finale del 19/12/2013 della commissione aggiudicatrice appositamente nominata dal RUP in data 22/11/2013, con determinazione dirigenziale n.64/6 del 28.01.2014 si è proceduto alla presa d'atto della regolarità della procedura seguita nell'esperimento di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.55 del D. Lgs. n.163/2006 e, quindi, alla conseguente definitiva aggiudicazione dell'appalto delle "forniture e dei servizi connessi all'allestimento e attivazione del Museo di Torre Alemanna" all'A.T.I. Bawer spa - capogruppo, Consorzio Idria scrl mandante - con sede in Altamura (BA) alla Via Solferino, n. 4 per il prezzo di € 523.784,42, oltre a € 5.869,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, dedotto del ribasso del 12.766% sull'importo a base d'asta di € 606.306,00, oltre IVA come per legge.

Con determinazione n.488/68 dell'11.06.2014 è stato affidato all'arch. Vincenzo Russo, ai sensi dell'art. 91, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, l'incarico di direzione e coordinamento della sicurezza per l'attuazione dell'intervento in argomento. Per le relative competenze, contrattualizzate in € 46.967,33 oneri ed iva al 22% compresi, è stato assunto corrispondente e relativo impegno sui RR PP 2013 al cap. 31965, impegno n. 713, sub 2 provvisorio.

Tra la citata ATI "Bawer spa - capogruppo, Consorzio Idria scrl mandante" e l'Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 20.6.2014 con repertorio n. 158, registrato a Cerignola in data 24.06.2014 al n. 26 S.1^ aa.pp.

In data 7.7.2014 è stato disposto l'avvio delle prestazioni di cui al citato contratto. Con verbale in pari data, è stata constatata l'impossibilità a procedere con l'esecuzione delle prestazioni previste nel suddetto contratto per la necessità di operare interventi ritenuti propedeutici allo svolgimento delle stesse.

In data 16.07.2014 si è svolta presso i luoghi dell'attivando Museo, alla presenza dell'ATI esecutrice del contratto, del Direttore per l'esecuzione, nonché delle Soprintendenze per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Puglia e per i Beni Archeologici della Puglia, nelle persone rispettivamente della dott.ssa Rosa Lorusso e dott.ssa Giovanna Pacilio, una conferenza di servizi che ha consentito, illustrati i contenuti di progetto esecutivo ed i programmi di svolgimento delle attività e prestazioni previste in contratto, il concordamento e la successiva definitiva stesura del progetto scientifico di allestimento, conformemente a quanto contenuto nel parere di competenza della Soprintendenza per Beni Archeologici della Puglia, rilasciato sul progetto esecutivo in data 10.09.2013.

2

In data 30.07.2014 con nota prot. n. 17604 è stata inviata alla Soprintendenza per Beni Archeologici della Puglia la richiesta per il "deposito del materiale di interesse archeologico di proprietà dello Stato presso il Museo di Torre Alemana", corredata di apposito layout di allestimento e progetto di ordinamento museale rielaborato in forma esecutiva con riferimento ai contenuti tematici, cronologici e storici dei reperti archeologici, a seguito degli accordi condivisi nel corso della conferenza di servizi del 16.7.2014, nonché di successivi incontri informali presso le rispettive su indicate Soprintendenze.

In data 31.07.2014, giusto verbale in atti, pur persistendo alcune cause ostative all'avvio dell'intera esecuzione del contratto di appalto delle forniture e servizi connessi all'allestimento ed attivazione del Museo, si è proceduto all'avvio parziale dello stesso, ai sensi dell'art.304 del DPR n.207/2010.

Con determina dirigenziale n.667/105 del 09/09/2014 è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori di manutenzione (straordinaria) connessi all'allestimento ed attivazione del Museo, di cui al capitolo 1 del computo metrico estimativo di progetto (lettera a dell'art.5 del Bando Regionale) per il previsto importo di € 18.762,60, oltre ad € 9.176,00 per oneri incidenza manodopera ed € 3.211,40 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, individuando nella procedura negoziata il procedimento di scelta del contraente, di cui all'art. 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006, con sistema di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore rispetto a quello posto a base di gara da determinarsi mediante l'indicazione del massimo ribasso percentuale. Il relativo invito è stato diramato direttamente, mediante raccomandata a.r. prot. n. 20362 del 15.9.2014, a n.5 ditte locali aventi i requisiti per espletare i suddetti lavori.

Con determinazione dirigenziale n.774/119 del 08/10/2014, preso atto del verbale di gara tenutasi in data 25/09/2014 ed accertata la regolarità della procedura seguita nell'esperimento della stessa, è stato provveduto ad aggiudicare definitivamente alla ditta Edil Fasano S.r.l. di Cerignola, per il prezzo di € 17.683,75, dedotto del ribasso offerto del 5,75% sull'importo a base d'asta di € 18.762,60, oltre ad € 9.176,00 per incidenza manodopera ed € 3.211,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, i suddetti lavori di manutenzione (straordinaria).

Tra la predetta Ditta Edil Fasano S.r.l. e questa Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto, per scrittura privata, in data 27.11.2014 raccolta n.398/Uff. Contr., registrato a Cerignola in data 10.12.2014 al n. 2166 S.1^ aa.pp.

Con determinazione dirigenziale n.731/113 del 23.09.2014 è stata approvata una perizia di variante relativa all'appalto delle forniture e servizi connessi all'allestimento ed

attivazione del Museo, la quale non ha alterato l'importo di cui al relativo contratto repertorio n.158 del 20.6.2014.

Sulla variante si sono favorevolmente espresse la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Puglia-Bari, in data 24.10.2014 (prot.4516 Cl.34.19.04/1.3) e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia Taranto in data 13.11.2014 (prot.14089 Cl.34.19.04).

In relazione ai risultati di gara, con determinazione dirigenziale n.844/135 del 28.10.2014 si è proceduto, fatta salva la superiore approvazione da parte del Responsabile di Misura Regionale, a rideterminare il quadro economico post-gara, imputando la relativa spesa di € 840.740,38 per € 740.740,38, corrispondente all'importo ritenuto ammissibile a finanziamento a seguito della gara d'appalto, a carico della Regione Puglia, al cap. 31965 del bilancio 2013 - impegno n. 713, correlato alla risorsa 4.03.10.20, (cap. 40833) bilancio 2013 - acc. n. 49, e per € 100.000,00, corrispondente all'importo di cui alle spese tecniche e generali non ammesse a finanziamento dal bando della Regione Puglia ed accollate a questo Ente attuatore, all'intervento 2.01.05.01, cap. 30585, bilancio 2011 - imp. n.588/11.

Con determinazione dirigenziale n.48/10 del 09/02/2015, in relazione ai rilievi mossi dal competente Ufficio Regionale con nota del 23.12.2014 (pervenuta via mail), si è proceduto a rettificare il quadro economico post-gara di seguito riportato, stralciando dallo stesso la voce "imprevisti", ritenuta non ammissibile a finanziamento POC Puglia e, quindi, rideterminata la spesa progettuale in € 790.687,00, imputata per € 690.687,00, a finanziamento POC ed al cap. 31965 del bilancio 2013 - impegno n. 713, correlato alla risorsa 4.03.10.20, (cap. 40833) bilancio 2013 - acc. n. 49, e per € 100.000,00 a bilancio di questo Ente attuatore ed all'intervento 2.01.05.01, cap. 30585, bilancio 2011 - imp. n.588/11:

A	Lavori/forniture/servizi	Pre-gara €	Post-gara
	Importo delle forniture e servizi al netto del ribasso d'asta del 12,776% e degli oneri di sicurezza: lettera b) (servizi di fruizione e di accoglienza, servizi per la didattica, servizi per la conservazione e restauro delle opere da esporre) e c) del bando (attrezzature per fruibilità da parte di soggetti disabili):	600.436,10	523.784,42
	Oneri di sicurezza	5.869,91	5.869,91
1	Totale forniture e servizi (lettere b. e c. del bando + oneri speciali di sicurezza)	606.306,00	529.654,33
	Lettera a) del bando: Importo lavori di manutenzione	18.762,60	17.683,75
	incidenza manodopera	9.176,00	9.176,00
	Oneri della sicurezza	3.211,40	3.211,40
2	Totale lavori (lettere a) del bando compreso oneri incidenza manodopera e sicurezza	31.150,00	30.071,15
	Totale Lavori/forniture/servizi	637.456,00	559.725,48
B	somme a disposizione dell'amministrazione		

1	ammissibili a finanziamento (art.5 del bando Regione Puglia)		
	IVA su forniture/servizi/lavori (lettera f.del bando)- prevista in progetto al 21%-adeguata a 22%	133.387,32	123.139,61
	Spese per pubblicità bando di gara, di cui € 454,36 per relativa iva (lettera e. del bando)	2.500,00	2.821,91
	Indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici (VVFF, ecc..) (lettera d. del bando)	5.000,00	5.000,00
	Imprevisti		
	Totale progetto finanziabile come da bando regionale	778.821,76	690.687,00
2	a carico dell'Amministrazione Comunale		
	progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	39.900,00	39.900,00
	Direzione delle attività e prestazioni previste in contratto di forniture e servizi e lavori manutenzione - coordinamento sicurezza		37.017,12
	C.N.P.A.I.A. 4% (su progettaz. € 1.596,00 e direzione e coordinamento esecuzione contratti € 1.480,69)	1.596,00	3.076,69
	IVA su spese tecniche e CNPAIA (21% su progettazione € 8.714,16 già pagata/ 22% su direzione e coordinamento prestazioni di contratto € 8.469,52)	11.391,48	17.183,68
	incentivo 2% ex art.92 del D.Lgs. 163/2006	12.749,12	2.822,51
	totale altre somme a disposizione escluse da finanziamento	65.636,60	100.000,00
	TOTALE GENERALE progetto	844.458,36	790.687,00

In data 24.11.2014, giusto verbale n.3 in atti ed in aggiunta a quanto già avviato con precedente verbale del 31.07.2014, si è proceduto ad un ulteriore avvio parziale delle prestazioni previste nel contratto relativo alle forniture e servizi connessi all'allestimento.

Ciò stante, l'arch. Vincenzo Russo, direttore dell'esecuzione del progetto, ha trasmesso, giusta nota acquisita in data 08/07/2015, il 2° stato di avanzamento delle prestazioni relative alle forniture e servizi, eseguiti dall'A.T.I. aggiudicataria, "Bawer spa (capogruppo-mandataria) e Consorzio Idria scrl (mandante)", a tutto il 30.06.2015, per il complessivo importo, al netto del ribasso del 12,766%, di € 322.995,96, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 3.579,61, non soggetti a ribasso, nonché il relativo libretto delle misure e certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotti l'acconto di cui al 1° S.A. e le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta A.T.I. appaltatrice il credito di € 151.928,88, oltre IVA nella misura del 22%.

Si ritiene, vista la regolarità degli atti ed il parere favorevole dell'ing. Clorindo Izzillo, nella detta qualità di Responsabile del Procedimento, di procedere all'approvazione del suddetto 2° stato di avanzamento delle prestazioni e relativo certificato di pagamento con conseguente riconoscimento a favore della dall'A.T.I. aggiudicataria, "Bawer

spa (capogruppo-mandataria) e Consorzio Idria scrl (mandante)" del credito di € 185.353,24, IVA al 22% compresa.

La relativa spesa di detti € 185.353,24, necessaria per il pagamento del corrispettivo 2° SA delle suddette prestazioni contrattuali, trova capienza nelle risorse assegnate dalla Regione nell'ambito del PO FESR 2007-2013 Asse IV - Linea di intervento 4.2 Azione 4.2.1 D) ed imputazione sul Capitolo 31965 intervento 2.05.01.01 - RR.PP. 2013, impegno n.713 sub 1.

Dato atto che all'intervento è stato attribuito il CUP: J33D13000200002, mentre alle gare di cui alle forniture/servizi in argomento il CIG: 53704993F9, ai lavori edili il CIG: Z1810B0BC5, all'affidamento della progettazione il CIG: Z0804DE3FD e a quello di direzione e coordinamento delle attività dei contratti il CIG:Z680F9EA20.»

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.ed i.;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti DPR 207/2010;

Visto l'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 25/06/2015, prot. n. 16286/Gab., con il quale si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza dei Settori Tecnici comprendente i Servizi Urbanistica - PRG - Patrimonio - Edilizia Privata - Lavori Pubblici - Manutenzione - Polizia Mortuaria - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare il 2° stato di avanzamento relativo alle forniture e servizi connessi "Allestimento e attivazione del Museo di Torre Alemanna", emesso dal direttore dell'esecuzione del progetto, arch. Vincenzo Russo, per il complessivo importo di € 322.995,96, al netto del ribasso del 12,766% e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 3.579,61 non soggetti a ribasso, eseguiti a tutto il 30.06.2015 dall'A.T.I. aggiudicataria, "Bawer spa (capogruppo-mandataria) e Consorzio Idria srl (mandante)", in dipendenza del contratto di appalto repertorio n. 158 stipulato in data 20.06.2014, registrato a Cerignola il 24.06.2014 al n. 26 S.1^ aa.pp.;

3) di approvare il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, con il quale è stato accertato e riconosciuto, dedotti l'acconto di cui al 1° S.A. e le ritenute di legge, a favore della predetta A.T.I. aggiudicataria dei servizi e forniture, il credito di € 151.928,88, oltre IVA nella misura del 22% pari ad € 33.424,36 e, quindi, di complessivi € 185.353,24;

4) di liquidare il detto importo, di complessivi € 185.353,24 IVA compresa, a favore della predetta ATI "Bawer spa (capogruppo-mandataria) e Consorzio Idria srl (mandante)", e pagare per essa ATI, previo accredito delle necessarie somme da parte della Regione Puglia, a favore della capogruppo-mandataria Bawer Spa l'importo di € 152.055,62 ed a favore del Consorzio Idria Soc. Consort. a r.l. l'importo di € 33.297,62, giuste comunicazioni e pre-fatture in atti;

5) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

6) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 185.353,24, necessaria per il pagamento a favore della predetta ATI, sul Capitolo 31965 intervento 2.05.01.01 - RR.PP. 2013, impegno n.713 sub 1, imputandola sul Bilancio 2015 (risorsa 4.03.10.20, cap. 40833, bilancio 2013, acc. n. 49, correlata al finanziamento assegnato dalla Regione Puglia nell'ambito del PO FESR 2007-2013 Asse IV - Linea di intervento 4.2 Azione 4.2.1 D);

Si precisa che gli impegni definitivi sono specificati nell'allegata attestazione dell'Area Economica Finanziaria, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

7) di dare opportuna comunicazione del presente atto alla Struttura Regionale competente, nei termini di cui al disciplinare sottoscritto tra questo Comune e la Regione Puglia, ai fini della rendicontazione delle spese;

8) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla Sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Atto N.520/123

In data **16-07-15**

OGGETTO: PO FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea 4.2 - Azione 4.2.1. - Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemanna - Approvazione 2' stato di avanzamento delle forniture e servizi connessi all'allestimento e attivazione del museo.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 185.353,24 (CIG. 53704993F9) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
31965/	185.353,24	293	08-10-2013	2050101	

Cerignola, li 16-07-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. Di Tuccio dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Mastroserio ING. Vito

Copia conforme all'originale, **16-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-07-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **18372** del **16-07-15** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **16-07-15**.

Dal Palazzo di Città, **16-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-07-15** al **31-07-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-08-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE : ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35692819	del	27/05/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151993309648		

Spett.le BAWER SPA
BAWER@PEC.BAWER.IT

Impresa	BAWER SPA				
Sede legale	VIA SOLFERINO 4 70022 ALTAMURA (BA)				
Sede operativa/Ind attività	VIA SOLFERINO 4 70022 ALTAMURA (BA)				
Codice Fiscale	05593210726	e-mail	BAWER@PEC.BAWER.IT	e-mail PEC	BAWER@PEC.BAWER.IT
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di ALTAMURA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 13152630
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 03/06/2015	
Il responsabile del procedimento BASILE MARIA	
☒ I.N.P.S. - Sede di MATERA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 4701907604
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/05/2015	
Il responsabile del procedimento AVOLIO ANNACESIRA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire.

IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI.


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall' INPS in data 04/06/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

AVOLIO ANNACESIRA



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_434286	Data richiesta	03/07/2015	Scadenza validità	31/10/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BAWER SPA
Codice fiscale	05593210726
Sede legale	VIA SOLFERINO, 4 70022 ALTAMURA (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
Servizio Lavori Pubblici

Prot. n. 25834

Cerignola, 08 OTT. 2015

OGGETTO: "Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemanna" - Forniture e servizi connessi all'allestimento ed attivazione del Museo di Torre Alemanna - Contratto repertorio n. 158 del 20.06.2014, registrato il 24.06.2014 al n.26 S1^ aa.pp. - Finanziamento Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013 - Asse IV Linea d'intervento 4.2, Az.4.2.1 lett.D) - **A.T.I. Bawer SpA e Consorzio Idria Srl** - Cod. Identif. CUP J33D13000200002 - GIG 53704993F9 - Liquidazione corrispettivo 2° SA.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Adriano Saracino

SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento della somma di complessivi € 185.353,22, IVA al 22% compresa, a favore dell'**ATI Bawer SpA e Consorzio Idria Srl** a titolo di corrispettivo alla stessa dovuto per la esecuzione delle forniture e prestazioni di servizi connessi all'allestimento ed attivazione del Museo di Torre Alemanna in oggetto di cui al 2° S.A., giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.520/123 del 16.07.2015.

La detta somma, giuste indicazioni e fatture emesse dalle componenti la citata ATI, dovrà essere corrisposta:

- per € 152.055,60, iva compresa, a favore **Bawer SpA**, Capogruppo-mandataria, giusta fattura n.5 del 15.07.2015 di € 152.055,60 (€ 124.635,74 + iva per € 27.419,86), acquisita al prot. n.25165 del 01.10.2015;
- per € 33.297,62, iva compresa, a favore del **Consorzio Idria Srl**, mandante, giusta fattura n.5-2015/PA del 24.7.2015 di pari importo (€ 27.293,13 + iva per € 6.004,49), acquisita al prot. n.21039 del 10.08.2015.

I suddetti importi dovranno essere corrisposti mediante bonifico da effettuarsi sui conti correnti opportunamente comunicati dalle stesse imprese, giuste dichiarazioni ex art.3, comma 7 della L.136/2010, già in atti di codesto Servizio. I relativi mandati di pagamento dovranno essere emessi in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese alla Regione Puglia, Ente finanziatore dell'opera.

La spesa di € 185.352,22, trova imputazione, giusta la richiamata D.D. n. 520/123 del 2015, all'intervento 2.05.01.01, cap.31965 Bil.2013, impegno 713 sub 1, liquidazione 293, correlato alla risorsa 4:03:10.20, cap.40833, bil 2013, accert.49, ed al finanziamento regionale PO FESR 2007-2013 - Asse IV, Linea 4.2, Az.4.2.1 D), a valere sul 2° accredito di € 207.206,10 effettuato in conto contributo dalla Regione Puglia.

IL RUP
ing. Clorindo Izzillo

Si allega:

- fatture della Ditta Bawer SpA e Consorzio Idria Srl;
- DURC Ditte.

Il Dirigente
Settore Amministrativo Area Tecnica
dott.ssa Daniela Conte

BAWER

Automotive - Medical - Home Design - Museum



Spett. le

Città di Cerignola

Piazza della Repubblica

71042 CERIGNOLA (FG)

14052

OGGETTO: FORNITURE E SERVIZI CONNESSI ALL'ALLESTIMENTO E ALL'ATTIVAZIONE DEL MUSEO DI TORRE ALEMANNA.
Contratto Rep. N. 158 del 20/06/2014.
CIG. 53704993F9. CUP J33D13000200002.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

ai fini della Legge 136/2010 (la presente dichiarazione è resa ai sensi degli art. 38 e seguenti del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto **LORUSSO PASQUALE** in qualità di **Amministratore Unico** della ditta **BAWER S.p.A.** con sede in **Altamura (BA) cap. 70022 Via Solferino nr. 4 Cod. Fisc. 05593210726 Part. IVA 05593210726 Tel. 0835245911 Fax 0835245935** con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;


DICHIARA

1. che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti dei contratti stipulati con il Vs. Ente sono i seguenti:

- A) estremi identificativi:
Banca: **BANCA APULIA**
Agenzia/filiale: **Filiale di Altamura (BA)**
Codice IBAN: **IT75R0578741330007570039750**
Intestatario del conto: **BAWER SpA**
- B) generalità persone delegate ad operare:
 - **LORUSSO Pasquale** nato a **Altamura (BA)** il **04/05/1962** residente in **Altamura (BA) Via Maggio 1648 n. 89 C.F.: LRSPQL62E04A225Q** in qualità di **Amministratore Unico** della ditta **BAWER S.p.A.** con sede in **Altamura (BA) cap. 70022 Via Solferino nr. 4 C.F. e Part. IVA 05593210726**
 - **MANFREDI Antonio** nato a **Altamura (BA)** il **08/08/1961** residente in **Altamura (BA) Via Gradisca n. 10 C.F.: MNFNNTN61M08A225B** in qualità di **Procuratore** della ditta **BAWER S.p.A.** con sede in **Altamura (BA) cap. 70022 Via Solferino nr. 4 C.F. e Part. IVA 05593210726**

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con il Vs. Istituto, nonché l'esercizio da parte della stessa della facoltà risolutiva espressa dall'art. 10 della Legge 136/2010 in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.;

3. che, in relazione agli affidamenti in corso con il Vs. Istituto relativi ai lavori, servizi e alle forniture di cui al comma 1 art. 3 Legge 136/2010, provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti sia inserita, a pena di nullità,



BAWER

Automotive - Medical - Home Design - Museum



assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;

4. che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 2 della Legge 136/2010;


5. che in presenza di affidamenti afferenti a "Progetti di investimento Pubblico" procederà, in riferimento ad ogni transazione effettuata e pertanto su ogni bonifico bancario o postale disposto, all'indicazione del relativo Codice Unico di Progetto (CUP) o del Codice Identificativo di Gara (CIG);

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti sono utilizzati dal Vs. Istituto esclusivamente per le finalità connesse al rapporto contrattuale in essere con la stessa e che il trattamento avverrà attraverso gli archivi cartacei ed elettronici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nel rapporto contrattuale, salvo in ogni caso i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D. Lgs. 196/2003,

Matera, 15/07/2015



Il Dichiarante

BAWER SPA
Amministratore Unico
LORUSSO PASQUALE



Cognome **LORUSSO**
 Nome **PASQUALE**
 nato il **04/05/1962**
 (atto n. **447** P. I. **S. A**)
 a **ALTAMURA (BA)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ALTAMURA**
 Via **VIA MAGGIO 1648 89**
 Stato civile **conjugato**
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **190**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari


 Firma del titolare *Pasquale Lorusso*
ALTAMURA il **09/04/2013**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 D'ordine del Sindaco
 Istruttore Amministrativo
 Segr. d'Amministrazione
Antonella Calia

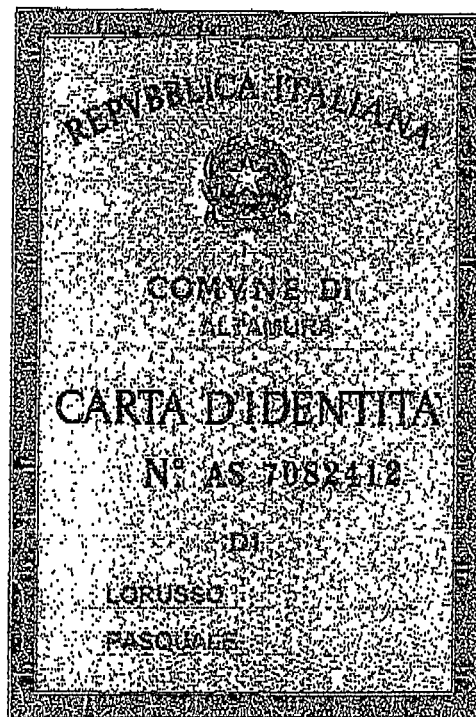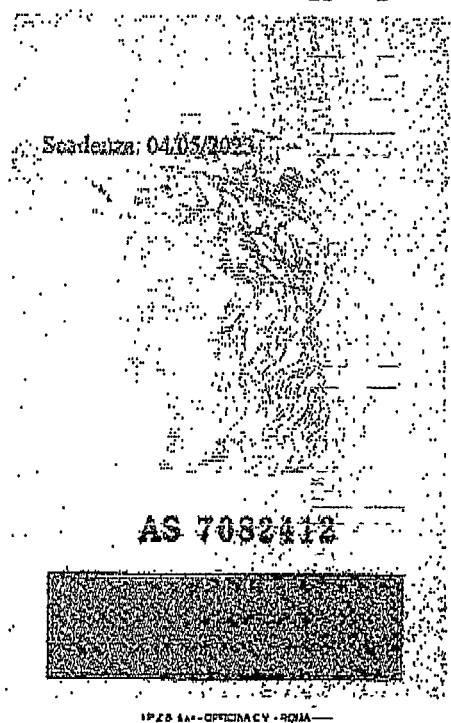**COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE**





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001409180

Identificativo Pagamento: PROT.25854/15

Importo: 124635,74 €

Codice Fiscale: 05593210726

Data Inserimento: 12/10/2015 - 9:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA
